



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

**ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS**

EN LA CIUDAD DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 29 DE ABRIL DEL 2019 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LIS C. ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL, ING. MISAEL OLIVIS CERVANTES, SUPERVISOR DE OBRAS, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ING. IVAN LUIS ESQUIVIES MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARRENDADORA ANGLOVER, S. A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

**DATOS GENERALES:**

1.- NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA:	
"10010058117 CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO Y ZONA DE FRENADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE CALZ. ANÁHUAC CON BLVL HÉCTOR TERÁN TERÁN, MEXICALI, B.C."	
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y ENTREGAN:	
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FRENADO MR-45 CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS OCTAGONALES EN POZOS DE VISITAS SANITARIO Y PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE ANILLO EN AGUA POTABLE, BOCAS DE TORMENTAS, EN AMBOS CUERPOS.	
3.- FUENTE DE RECURSOS: PRON/CREDITO	
4.- PROGRAMA: VIALIDADES URBANAS (B)	
5.- SUB-PROGRAMA: N/A	
6.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	
LICITACIÓN PÚBLICA ( X ) INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ( ) ADJUDICACIÓN DIRECTA ( )	
7.- NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	DE FECHA:
C-PRON/CREDITO-18-MXL-07	20 DE JULIO DEL 2018
8.- IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 8,783,381.50	
9.- IMPORTE FINAL CONTRATADO (INCLUYENDO CONVENIOS): \$ 7,171,191.97	
10.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ORIGINAL:	
DEL 15 DE AGOSTO DEL 2018 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	
11.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN INCLUYENDO LOS CONVENIOS:	
DEL 15 DE AGOSTO DEL 2018 AL 24 DE ABRIL DEL 2019	
12.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL:	
DEL 15 DE AGOSTO DEL 2018 AL 24 DE ABRIL DEL 2019	

DIRECCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO.

**DATOS DE INVERSIÓN.**

**AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS RECURSOS:**

NO. DE OFICIO AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MIPAL	BENEF	OTROS
10010167344	07 DE FEBRERO DEL 2018	\$4,193,269.60		\$4,193,269.60			
10010169722	04 DE JUNIO DEL 2018	\$1,668,477.94		\$1,668,477.94			
10010171325	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$2,851,633.96		\$2,851,633.96	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>\$8,713,381.50</b>		<b>\$8,713,381.50</b>	-	-	-

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS:**

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	PERIODO	IMPORTE CON I.V.A. (ESTIMADO AUTORIZADO)	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (CON I.V.A.)	DEVOLUCION DE RETENCION	IMPORTE EJERCIDO (CON I.V.A.)
# 01	A 581	15 de Agosto del 2018 al 31 de Agosto del 2018	\$642,717.49	\$192,815.24	\$0.00	\$449,902.24
# 02	A 585	01 de Septiembre del 2018 al 15 de Septiembre del 2018	\$491,071.27	\$147,321.38	\$0.00	\$343,749.89
# 03	A 593	16 de Septiembre del 2018 al 15 de Octubre del 2018	\$331,068.96	\$99,320.68	\$0.00	\$231,748.28
# 04	A 594	16 de Octubre del 2018 al 31 de Octubre del 2018	\$1,569,264.97	\$470,779.49	\$0.00	\$1,098,485.48
# 05	A 602	01 de Noviembre del 2018 al 15 de Noviembre del 2018	\$1,484,478.24	\$445,343.48	\$0.00	\$1,039,134.76
# 06	A 606	16 de Noviembre del 2018 al 30 de Noviembre del 2018	\$1,727,138.52	\$30,015.59	\$0.00	\$1,697,122.93
# 01 EXT	A 607	16 de Noviembre del 2018 al 30 de Noviembre del 2018	\$359,721.34	\$0.00	\$0.00	\$359,721.34
# 07	A 622	28 de Febrero del 2019 al 29 de Marzo del 2019	\$475,494.86	\$0.00	\$0.00	475,494.86
# 02 EXT	A 623	28 de Febrero del 2019 al 29 de Marzo del 2019	\$90,236.32	\$0.00	\$0.00	\$90,236.32
			<b>\$7,171,191.97</b>	<b>\$1,385,595.86</b>		<b>\$5,785,596.10</b>

**Importe de la obra.**

**\$ 7,171,191.97 (incluye el I.V.A.)**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EN ESTE ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTÁN PROPORCIONANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIENDO POR PARTE DE LA CONTRATANTE, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA, LOS CUALES INCLUYEN LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA MISMA SE LLEVARON A CABO; ADEMÁS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DESPUÉS DE ESTE ACTO DE RECEPCIÓN SON ÚNICAMENTE COMPETENCIA DE LA CONTRATANTE Y/O DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON RECIBIDOS MEDIANTE ESTA ACTA DE ENTREGA, DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LO CUAL CONSTITUIRÁ UNA FIANZA DE GARANTÍA, POR EL EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. FIANZA QUE ENTREGARÁ EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

**GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS**

FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS

FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2019

FIANZA NÚMERO: 3358-04349-9

IMPORTE: \$ 717,119.20

AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 10:30 HRS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2019, SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

**ENTREGA:**

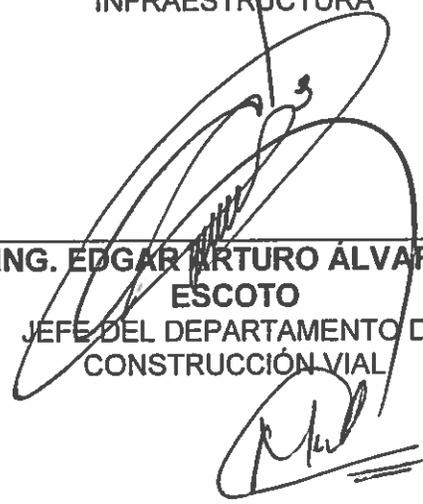
**CONTRATISTA**  
**ARRENDADORA ANGLOVER, S. A. DE**  
**C.V.,**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. WAN LUIS ESQUIVIAS MUÑOZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE:**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**Y DESARROLLO URBANO DEL**  
**ESTADO**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ALBERTO BARRA OJEDA**  
DIRECTOR DE OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURA

  
\_\_\_\_\_  
**ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ**  
**ESCOTO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN VIAL

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES**  
SUPERVISOR DE OBRA SIDUE

